
WindCast Agent — отчёт о прогнозе

- Станция: Kelmarsh (12.3 MW, Europe/London)
- Время выпуска: 2026-11-10 07:00
- Модель: ensemble
- Верификационный шлюз: пройден

Итоги (2026-11-10 08:00 – 2026-11-13 08:00)

- Энергия (P50): 139.1 MWh
- Интервал (P10–P90): 68.5 – 242.1 MWh
- Средняя мощность: 1.93 MW; Коэффициент использования мощности: 15.7%
- Максимум: 4.8 MW (2026-11-12 21:00); Минимум: 0.34 MW (2026-11-11 16:00)

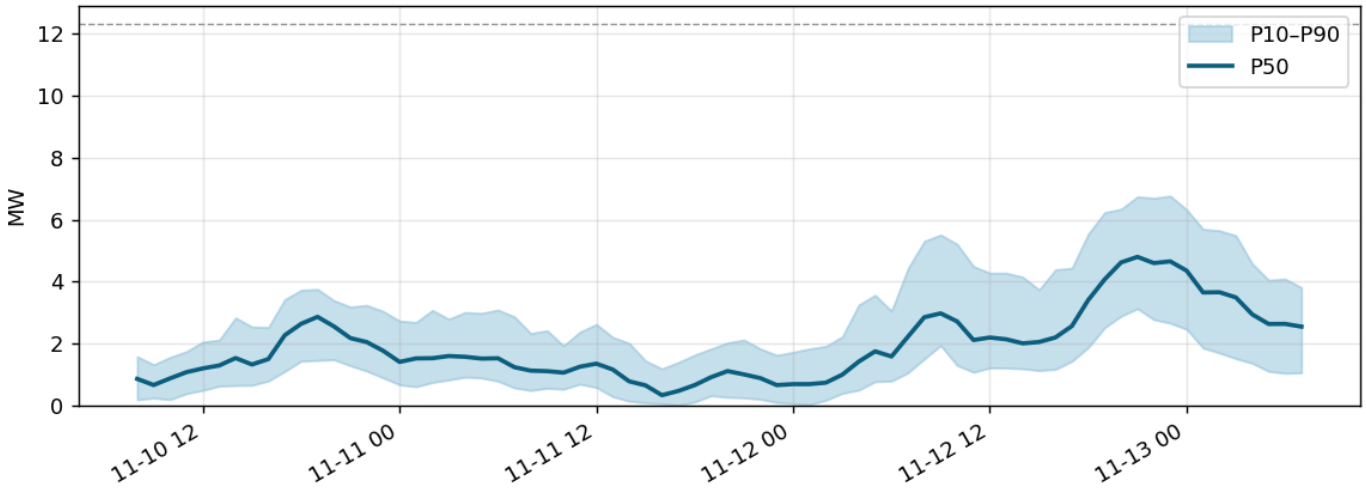

Периоды слабого ветра (ступица < 4 м/с, ≥ 6 ч)

- нет

Качество моделей (тестовый период, 24 ч)

Model	nMAE, %	Skill	CRPS, %	PICP80, %
M6 Ансамбль	6.36	0.691	4.97	83.7
M2 LightGBM-Q	6.39	0.69	4.99	82.9
M4 TFT	6.78	0.668	5.4	79.2
M1 Физикалық	6.93	0.66	5.46	81.8
M3 LSTM	7.33	0.646	5.87	75.8
M5 Chronos-Bolt	18.5	0.13	14.26	76.6
M0 Persistence	21.71	0.0	16.65	82.6
